

- SP 3 - ARDEATINA chiusa in corrispondenza del ponte ferroviario
- Viabilità alternativa - Via di Porta Medaglia
- Viabilità alternativa - Via di Torre Sant'Anastasia
- Viabilità alternativa - Via Castel di Leva
- Viabilità alternativa - SP3e - Ardeatina
- Ferrovia

Installare il su rappresentato cartello con dimensioni maggiori su:

- SP Ardeatina Km 9+500 (Uscita GRA di Ardea) Num. cartelli= 1
- SP Laurentina Km 14+000 dir.Roma (dopo rotonda cimitero) Num. cartelli= 1
- Santa Palomba (rotonda Ardeatina - Albano Torvaianica) Num. cartelli= 3
- SC S. Fumia Num. cartelli= 1

9

9A


9B



TRATTO DI INTERVENTO L= 2.500 M

Intervento di ripristino del manto stradale di Via Porta Medaglia per una superficie totale di 15.000 mq


TRATTO DI INTERVENTO L=200 M

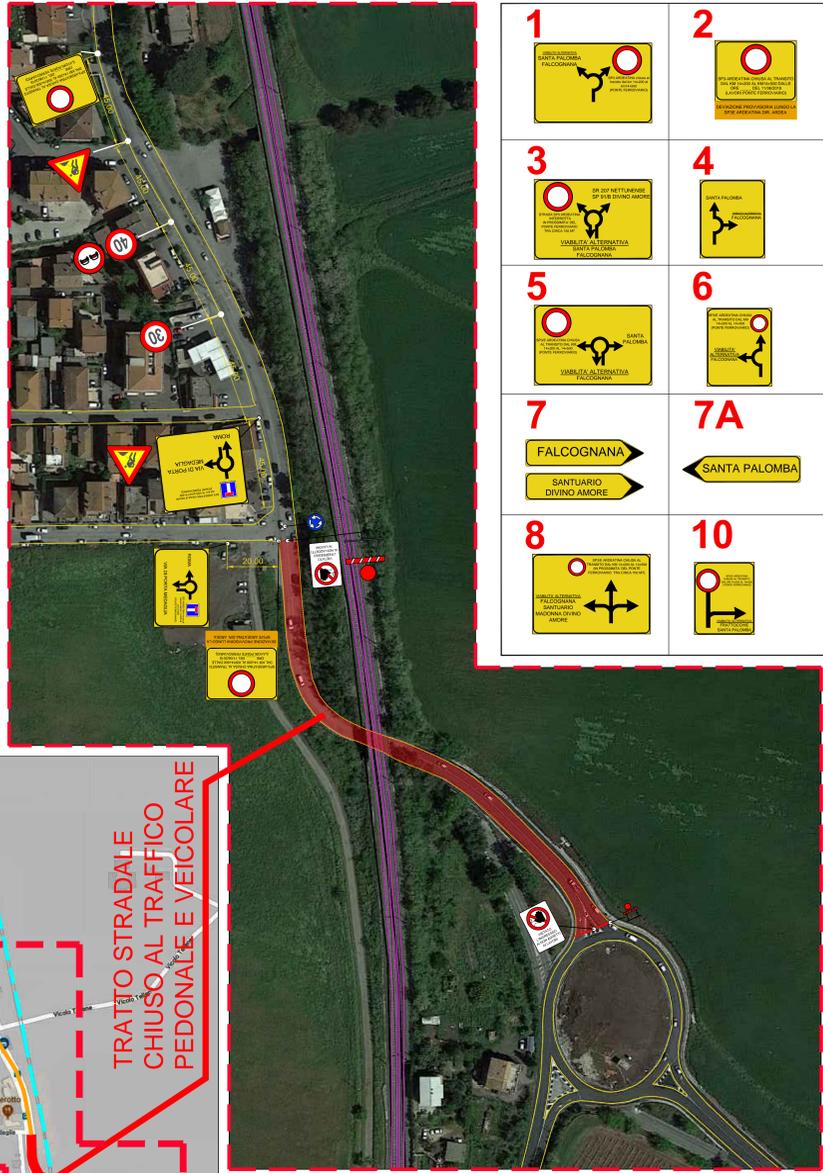

TRATTO STRADALE CHIUSO AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE

- SP 3e - ARDEATINA chiusa in corrispondenza del ponte ferroviario
- Viabilità alternativa - Via di Porta Medaglia
- Viabilità alternativa - Via di Torre Sant'Anastasia
- Viabilità alternativa - Via Castel di Leva
- Viabilità alternativa - SP3e - Ardeatina
- Ferrovia
- Via della Falcognana / Via del Divino Amore SP91/b
- Via Nettunense SR207
- Via Appia Nuova SS7

1	2	11
3	4	12
5	6	13
7	7A	14
8	10	15
		16

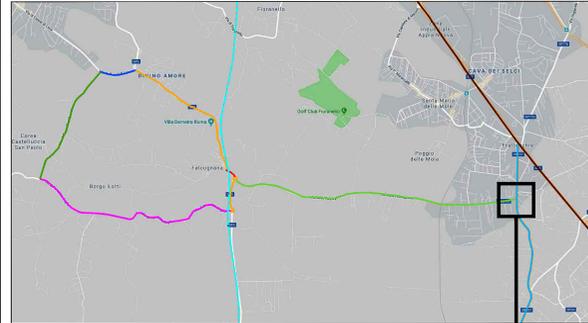

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA

PROGETTAZIONE: **ETS** STUDIO TECNICO

SOGGETTO TECNICO: S.O. INGEGNERIA

PROGETTO ESECUTIVO

C.A. n°1 del 30/01/2018 dell'A.Q. N°493/2017

Lavori di sostituzione del sottinteso ferroviario con nuovo scartamento in c.a. di km TR-497 della Linea Roma - Fiumicino in località Falcognana

SCATOLARE FALCOGNANA	SCALA	Vorie
VIABILITA' PROVVISORIA ALTERNATIVA E SEGNALETICA DI CANTIERE	LIVELLO	OPERA
	AREA	ELAB.
	ETS	01
	09	04

Revis.	Descrizione	Progettato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	PRIMA EMISSIONE		10/05/2016						

FILE: Chiusura_stradale_Rev_2.dwg
